


CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FISICO FINANCEIRO REFORMA E ADEQUAÇÃO - HEMOCENTRO ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE I - RIO VERDE

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total - Obra
1,0	CONTRATO ORIGINAL E 1º TA	R\$ 1.029.200,00
2,0	2º ADITIVO CONTRATUAL	prorrogação de prazo
3,0	3º ADITIVO CONTRATUAL	prorrogação de prazo
4,0	4º ADITIVO CONTRATUAL	R\$ 267.412,06
5,0	5º ADITIVO CONTRATUAL	prorrogação de prazo
6,0	6º ADITIVO CONTRATUAL	R\$ 311.704,62
7,0	TOTAL (VALOR GLOBAL)	R\$ 1.608.316,68


INICIO (O.S.)		10 à 31 Janeiro	01 à 28 Fevereiro	01 à 31 Março	01 à 30 Abril	1 à 31 Maio	01 à 30 Junho
		MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO
MARCOS REALIZADOS	Janeiro/22 a Junho/22	31/01	28/02	31/03	30/04	31/05	30/06
% EXECUTADO NO PERÍODO	Início da obra.	20,53%	14,43%				
MARCOS PLANEJADOS	Acumulado	31/01	28/02	31/03	30/04	31/05	30/06
PLANEJADO ACUMULADO	100,00%	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%
EXECUTADO ACUMULADO	100,00%	13,14%	27,57%	39,71%	51,85%	63,99%	100,00%
DIFERENÇA PLANEJADO X EXECUTADO ACUMULADO	0,00%	-3,53%	-5,76%	-10,29%	-14,82%	-19,34%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total - Obra	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	ago/22	TOTAL FATURADO E MEDIDO
1.0	Reforma e readequação - HEMOGO Rio Verde	R\$ 1.328.530,00	Demolições Gerais, Retirada de Bancadas e Desinstalações da Rede Elétrica.	Serv. Preliminares e Gerais Paredes e Painéis Cobertura e Impermeabilizações Revestimentos Pavimentação Instalações Diversos / Execução e Vedação	Recepção central, piso superior, demolição, forro acartonado, rede elétrica. PROCESSO 2022002605	Recepção central, piso inferior, demolição, forro acartonado, rede elétrica. PROCESSO 2022003411	Acabamentos elétricos e de pintura PROCESSO 2022004012	Acabamentos elétricos e de pintura PROCESSO 2022004900	Itens do aditamento e parcela final PROCESSO 2022006176	R\$ 1.608.316,68
	Medições Faturadas	R\$	R\$ 211.331,96	R\$ 232.158,39	R\$ 195.236,55	R\$ 195.236,55	R\$ 195.236,55	R\$ 267.412,06	R\$ 311.704,62	R\$ 1.608.316,68

Acumulado Previsto vs Realizado

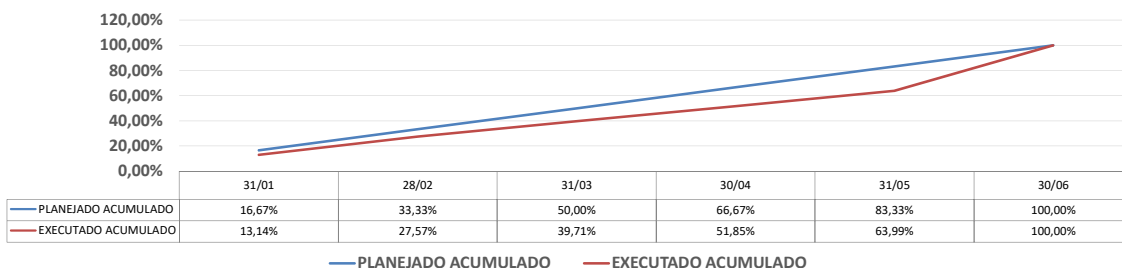

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HEMOCENTRO ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE I - RIO VERDE



■ Concluído ■ Em Andamento
