

ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO

PROCESSO IDTECH Nº 2023002350


CONTRATADA:

GBM MULT SERVICE - EIRELI CNPJ/MF sob o nº 17.672.848/0001-61

Vigência Contratual:	Prazo de execução da obra:	Valor:	Link para acesso ao contrato:
CONTRATO Nº 317/2023	14 meses 420 dias (11/09/2023 a 03/11/2024)	R\$ 13.045.000,00	https://redesidb.org.br/assin/D033023/01501_202301111302.pdf
Valor Total Geral		R\$ 13.045.000,00	

MEDIÇÕES	11/09 a 25/09	26/09 a 10/10	11/10 a 25/10	26/10 a 09/11	10/11 a 24/11	25/11 a 09/12	10/12 a 24/12	25/12 a 08/01	09/01 a 23/01	24/01 a 07/02	08/02 a 22/02	23/02 a 09/03	09/03 a 23/03	24/03 a 07/04	08/04 a 22/04	23/04 a 07/05	08/05 a 22/05	23/05 a 06/06	07/06 a 21/06	22/06 a 06/07	07/07 a 21/07	22/07 a 05/08	06/08 a 20/08	21/08 a 04/09	05/09 a 19/09	20/09 a 04/10	05/10 a 19/10	20/10 a 03/11	
	PLANEJADO ACUMULADO	100,00%	1,23%	3,48%	3,72%	3,86%	3,86%	3,72%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
EXECUTADO ACUMULADO	22,08%	1,16%	1,24%	1,21%	1,93%	1,46%	1,69%	1,21%	1,37%	2,03%	1,30%	0,64%	1,14%	3,67%	2,13%														
DIFERENÇA PLANEJADO X EXECUTADO ACUMULADO	-77,82%	-0,67%	-2,24%	-2,51%	-1,93%	-2,40%	-2,03%	-2,81%	-3,05%	-2,39%	-3,12%	-3,78%	-3,28%	-0,88%	-1,87%	-4,00%	-4,00%	-4,00%	-3,72%	-3,72%	-3,72%	-3,72%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-1,01%
Descrição das medições	<p>Preparação do Canteiro de Obras. Abertura da alvenaria da platibanda, para instalação do cremalheira. Fechamento com gesso acartonado, para isolamento interno da etapa da obra. Demolição e retrabamento de entalhos.</p> <p>Placa de Obra. Demolição de alvenarias e instalações hidráulicas e elétricas. Retrabamento de entalhos. Início das instalações novas. Execução de contrapisso, requadramento de portas e janelas, alvenarias, chapisco e reboco.</p> <p>Demolição de alvenarias, revestimentos, janelas e instalações hidráulicas e elétricas. Retrabamento de entalhos. Início das novas instalações elétricas, hidráulicas e de gases. Execução de contrapisso, requadramento de portas e janelas, alvenarias, chapisco, reboco e emassamento.</p> <p>Demolição, execução de contrapisso, impermeabilização, revestimento, requadramento de portas, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. Instalação do perfil das janelas. Continuação das instalações elétricas, hidrosanitárias e de gases.</p> <p>Execução de contrapisso, impermeabilização, revestimento, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. Instalação do perfil das janelas. Continuação das instalações elétricas, hidrosanitárias e de gases.</p> <p>Contrapisso, impermeabilização, revestimento, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. Instalação dos alumínios de acabamento do revestimento das paredes. Início de form das paredes. Continuação das instalações elétricas, hidrosanitárias e de gases.</p> <p>Contrapisso, impermeabilização, revestimento, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. Instalação dos alumínios de acabamento do revestimento das paredes. Continuação das instalações elétricas, hidrosanitárias e de gases.</p> <p>Emassamento, revestimentos, contrapisso, bancadas, esquadrias e continuação das instalações elétricas, hidrosanitárias e de gases.</p> <p>Demolição de alvenarias, instalações hidráulicas e elétricas. Retrabamento de entalhos. Execução de contrapisso, requadramento de portas e janelas, alvenarias, chapisco e reboco. Emassamento, pintura, instalações elétricas e hidrosanitárias e revestimentos de piso e parede.</p> <p>Execução de contrapisso, revestimento, alvenarias, chapisco e reboco. Emassamento, pintura, instalações elétricas e hidrosanitárias e revestimentos de piso e parede.</p>																												
Valores medições efetuadas	R\$ 151.480,20	R\$ 161.791,45	R\$ 158.288,52	R\$ 252.312,99	R\$ 190.607,13	R\$ 219.820,31	R\$ 158.393,36	R\$ 178.595,81	R\$ 264.308,72	R\$ 169.294,56	R\$ 82.968,43	R\$ 148.682,05	R\$ 466.197,33	R\$ 278.143,30															
TOTAL GERAL FATURADO/MEDIDO															R\$												2.879.943,68		

INFOGRÁFICO DO PLANEJADO X EXECUTADO

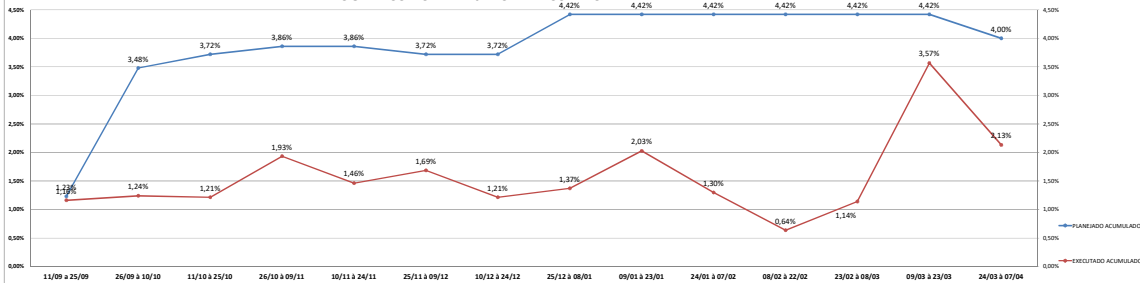

INFOGRÁFICO DO EXECUTADO X À EXECUTAR

