




CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FISICO FINANCEIRO REFORMA E ADEQUAÇÃO - UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE IPORA - GO

INICIO (O.S.)		15 à 31 Julho	01 à 15 Agosto	16 à 31 Agosto	01 à 15 Setembro	16 à 30 Setembro	01 à 15 Outubro		
		MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO		
MARCOS REALIZADOS	Julho/21 a Outubro/21								
% EXECUTADO NO PERÍODO	0,00%								
MARCOS PLANEJADOS	Julho/21 a Outubro/21	31/jul	15/ago	31/ago	15/set	30/set	15/out		
PLANEJADO ACUMULADO		0,00%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%		
EXECUTADO ACUMULADO		0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
PLANEJADO MENSAL		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
DIFERENÇA PLANEJADO X EXECUTADO ACUMULADO		0,00%	6,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%		
ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total - Obra	julho	agosto	agosto	setembro	setembro	outubro	TOTAL FATURADO
1.0	Processo 2020000614	R\$ 448.000,00	Demolições Gerais, Retirada de Bancadas e Desinstalações da Rede Elétrica	Reenquadramento de Janelas, portas e portais, inicio das instalações elétricas e revisão das instalações hidrosanitárias. Infraestrutura de Cobertura/Telhado, instalações de portas, portais e janelas, adequação em alvenaria dos setores.		Infraestruturas de rede, elétrica, hidráulica, ar condicionado e CFTV.	Inicio do emassamento e pinturas e qualificação da parte externa da edificação. Instalações gerais, revisão fachada, e estruturas externas com entrega da obra.		
2.0			Medições Faturadas	R\$ 74.666,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

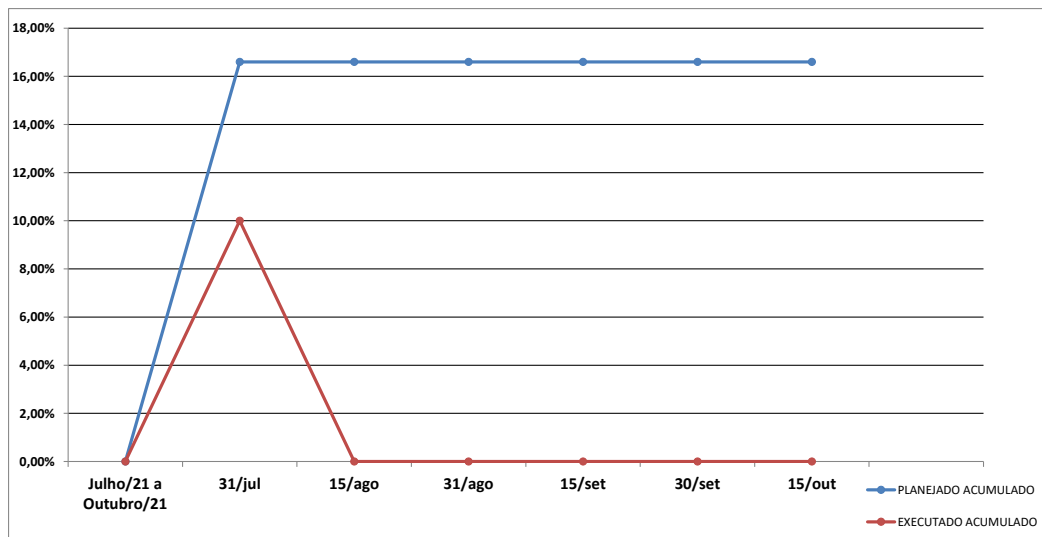

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE IPORÁ - GO

