


CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FISICO FINANCEIRO REFORMA E ADEQUAÇÃO - HEMOCENTRO ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE I - RIO VERDE

INÍCIO (O.S.)		10 à 31 Janeiro	01 à 15 Fevereiro	16 à 28 Fevereiro	01 à 15 Março	16 à 31 Março	01 à 10 abril
		MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO
MARCOS REALIZADOS	Janeiro/22 a Abril/22	31/jan	15/fev	28/fev	15/mar	31/mar	10/abr
% EXECUTADO NO PERÍODO	Início da obra.	20,53%					
MARCOS PLANEJADOS	Acumulado	31/01	15/02	28/02	15/03	31/03	10/04
PLANEJADO ACUMULADO		16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%
EXECUTADO ACUMULADO		20,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PLANEJADO MENSAL		103,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,00%
DIFERENÇA PLANEJADO X EXECUTADO ACUMULADO		3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total - Obra	Janeiro
1.0	Reforma e readequação - HEMOGO Rio Verde	R\$ 1.029.200,00	Demolições Gerais, Retirada de Bancadas e Desinstalações da Rede Elétrica.
2.0			Medições Faturadas R\$ 211.331,96

Acumulado Previsto vs Realizado

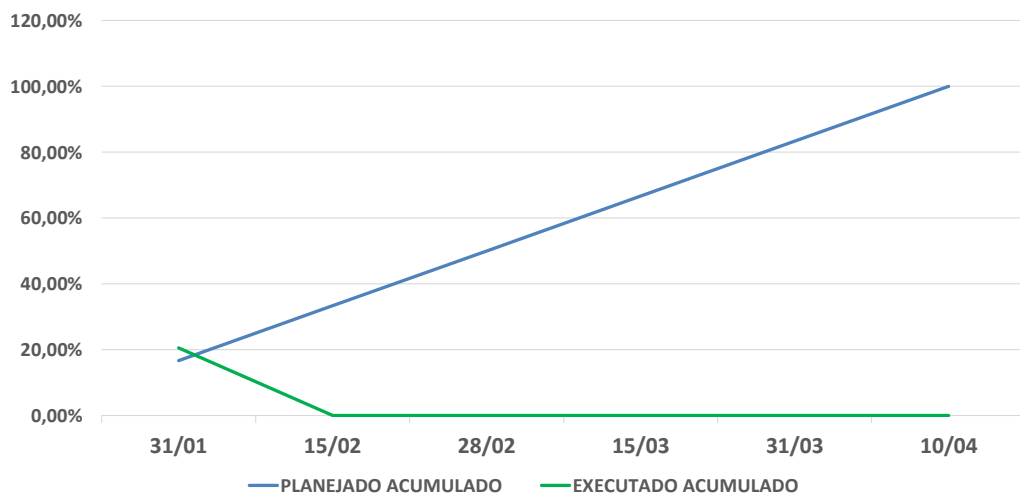

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HEMOCENTRO ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE I - RIO VERDE

