HGG | Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi - HGG

SUS SES Secretaria de Estado da Saúde | Governo de GOIÁS

**ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO** **PROCESSO IDTECH Nº 2023002350** **CONTRATADA:** **GBM MULT SERVICE - EIRELI CNPJ/MF sob o nº 17.672.848/0001-61**

| | Vigência Contratual: | Prazo de execução da obra: | Valor: | Link para acesso ao contrato: |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 317/2023 | 14 meses | 420 dias (11/09/2023 a 03/11/2024) | R$ 13.045.000,00 | https://gedoc.idtech.org.br/gescon/202308/21/015603_20230821163302.pdf |
| | Valor Total Geral | | R$ 13.045.000,00 | |
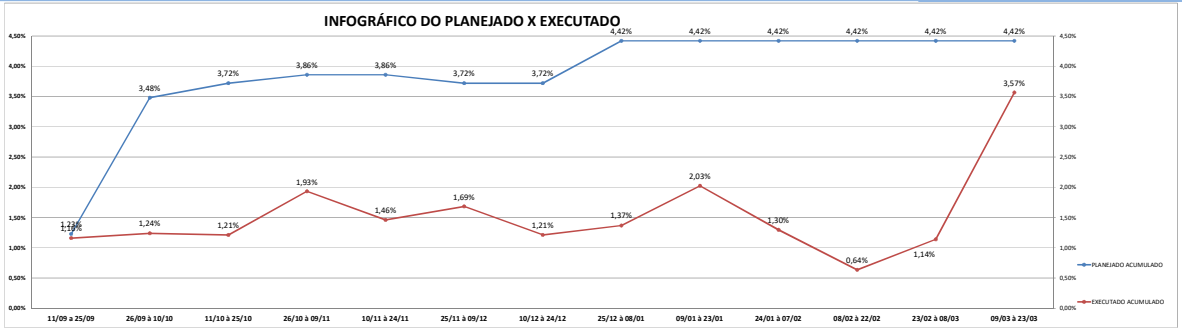
| MEDIÇÕES | | 11/09 a 25/09 | 26/09 à 10/10 | 11/10 à 25/10 | 26/10 à 09/11 | 10/11 à 24/11 | 25/11 à 09/12 | 10/12 à 24/12 | 25/12 à 08/01 | 09/01 à 23/01 | 24/01 à 07/02 | 08/02 à 22/02 | 23/02 à 08/03 | 09/03 à 23/03 | 24/03 à 07/04 | 08/04 à 22/04 | 23/04 à 07/05 | 08/05 à 22/05 | 23/05 à 06/06 | 07/06 à 21/06 | 22/06 à 06/07 | 07/07 à 21/07 | 22/07 à 05/08 | 06/08 à 20/08 | 21/08 à 04/09 | 05/09 à 19/09 | 20/09 à 04/10 | 05/10 à 19/10 | 20/10 à 03/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO |
| PLANEJADO ACUMULADO | 100,00% | 1,23% | 3,48% | 3,72% | 3,86% | 3,86% | 3,72% | 3,72% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 1,01% |
| EXECUTADO ACUMULADO | 19,94% | 1,16% | 1,24% | 1,21% | 1,93% | 1,46% | 1,69% | 1,21% | 1,37% | 2,03% | 1,30% | 0,64% | 1,14% | 3,57% | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFERENÇA PLANEJADO X EXECUTADO ACUMULADO | -80,06% | -0,07% | -2,24% | -2,51% | -1,93% | -2,40% | -2,03% | -2,51% | -3,05% | -2,39% | -3,12% | -3,78% | -3,28% | -0,85% | -4,00% | -4,00% | -4,00% | -4,00% | -3,72% | -3,72% | -3,72% | -3,72% | -3,00% | -3,00% | -3,00% | -3,00% | -3,00% | -3,00% | -1,01% |
| | | Preparação do Canteiro de Obras, Abertura da alvenaria da platibanda, para instalação da cremalheira, Fechamento com gesso acartonado, para isolamento interno da etapa da obra, Demolição e retirada de entulhos. | Placa da Obra, Demolição de alvenarias e instalações hidráulicas e Elétricas, Retirada de entulhos, Execução de Alvenarias, chapisco e reboco. | Demolição de alvenarias, revestimentos, janelas e instalações hidráulicas e Elétricas. Retirada de entulhos. Início das Instalações novas. Execução de contrapiso, requadramento de portas e janelas, alvenarias, chapisco e reboco. | Demolição de alvenarias, revestimentos, janelas, portas e instalações hidráulicas e Elétricas. Retirada de entulhos. Início das novas Instalações elétricas, hidráulicas e de gases. Execução de contrapiso, nivelamento, requadramento de portas e janelas, alvenarias, chapisco, reboco e emassamento. | Início das novas Instalações elétricas, hidros sanitárias e de gases. Execução de contrapiso, nivelamento, requadramento de portas e janelas, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. | Demolição, execução de contrapiso, impermeabilização, nivelamento, requadramento de portas, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. Instalação do peitoril das janelas. Início das novas Instalações elétricas, hidros sanitárias e de gases. | Demolição, execução de contrapiso, impermeabilização, nivelamento, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. Instalação do peitoril das janelas. Continuação das Instalações elétricas, hidros sanitárias e de gases. | Execução de contrapiso, impermeabilização, nivelamento, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. Instalação do peitoril das janelas. Continuação das Instalações elétricas, hidros sanitárias e de gases. | Execução de contrapiso, impermeabilização, nivelamento, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. Instalação dos alumínios de acabamento do revestimento das paredes. Início do forro. Instalação do peitoril das janelas. Continuação das Instalações elétricas, hidros sanitárias e de gases. | Contrapiso, impermeabilização, nivelamento, emassamento e revestimentos. Instalação dos alumínios de acabamento do revestimento das paredes. Continuação das Instalações elétricas, hidros sanitárias e de gases. | Contrapiso, impermeabilização, nivelamento, emassamento e revestimentos. Continuação das Instalações elétricas, hidros sanitárias e de gases. | Emassamento, revestimentos, contrapisos, bancadas, esquadrias e continuação das Instalações elétricas, hidros sanitárias e de gases. | Demolição de alvenarias, revestimentos, janelas e instalações hidráulicas e Elétricas. Retirada de entulhos. Execução de contrapiso, requadramento de portas e janelas, alvenarias, chapisco e reboco, emassamento, pintura, instalações elétricas e hidrossanitárias, e revestimentos de piso e parede. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores medições efetuadas | | R$ 151.460,20 | R$ 161.791,45 | R$ 158.288,52 | R$ 252.312,99 | R$ 190.607,13 | R$ 219.829,31 | R$ 158.383,36 | R$ 178.595,81 | R$ 264.308,72 | R$ 169.294,56 | R$ 82.968,43 | R$ 148.682,05 | R$ 465.197,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL FATURADO/ MEDIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ | | | | | | | | | | | 2.601.719,86 |
